

00 Acta constitucion SaborExpress

SABOREXPRESS — PROYECTO DE SOFTWARE

Yerson Stiven Cuellar Rubiano

Ficha de formación: 3145555

Expediente técnico y académico — APA 7

14 de octubre de 2026

Fuente documental: repositorios SaborExpressBack, SaborExpressWeb y SaborExpressMovil.

Las pruebas no ejecutadas se identifican como pendientes.

Acta de constitución y alcance del proyecto

Proyecto: SaborExpress | **Autor / integrante:** Yerson Stiven Cuellar Rubiano | **Ficha:** 3145555 | **Fecha:** 14 de octubre de 2026 | **Versión documental:** 4.0

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Identificación

Nombre: SaborExpress. **Naturaleza:** desarrollo de plataforma para operación y pedidos gastronómicos, con clientes web y móvil y backend central. **Equipo / ficha SENA / instructor / entidad patrocinadora:** pendientes de datos confirmados por sus responsables.

2. Justificación

La coordinación digital de catálogo, atención de mesa, preparación, pagos y domicilios puede mejorar trazabilidad operativa. El beneficio medible aún debe comprobarse en un piloto; aquí se registra una solución de ingeniería y su alcance técnico verificable.

3. Objetivo general

Analizar, documentar y validar una plataforma digital integrada para gestionar operaciones de restaurantes mediante API REST modular, portal web y aplicación móvil.

4. Alcance incluido y excluido

Incluye gestión de usuarios/roles, sedes, personal, catálogo, pedidos, pagos, reparto, notificaciones y configuraciones observadas en código. Excluye: prueba de operación real a escala, seguridad certificada, condiciones contractuales de Wompi, costos finalizados, mercadeo y flota física.

5. Entregables

SRS, análisis, propuesta, diseño, datos, catálogo API/Postman, instalación, manuales, plan de pruebas, matriz de trazabilidad, correctivos, informe de cierre y artículos académicos.

6. Interesados, cronograma y riesgos

Los roles de responsabilidad se definirán en acta aprobada. Cronograma relativo P1–P6 según propuesta técnica, sin fechas comprometidas. Riesgos principales: autorización intersede, cobros, migraciones, disponibilidad, datos personales, ausencia de pruebas reproducibles.

7. Criterios de aprobación

La documentación se considera entregable para **revisión**, no aceptada, cuando cada formato abre, los requisitos tienen pruebas trazables, el artículo identifica límites y los manuales corresponden a SHA documentados. La aprobación académica requiere revisión del instructor y evidencias operativas.

8. Línea base de alcance, gobernanza y entregables

Elemento	Alcance detallado	No se afirma
Producto	API REST de restaurante + clientes web y móvil	que sea microservicio o producción
Usuarios	cliente, caja, cocina, reparto, gerencia y administración	piloto con usuarios realizado
Funcional	pedidos, pagos, sedes, catálogo, personal, entregas	todos los módulos aceptados
Documental	SRS, SDD, plan QA, manuales y artículo científico	aprobación institucional
Plataforma	ASP.NET Core 8, Next.js 16, Expo 57	calidad del despliegue real
Investigación	estudio de caso documental y bibliografía dirigida	experimentos de campo
Ejecución	propuesta de fases con hitos verificables	fechas, costos y nombres inventados

9. Hitos y criterios de decisión

H1 Alcance y requisitos aprobados: matriz SRS revisada por responsable funcional, reglas de sede y pago precisadas. **H2 Arquitectura aprobada:** diagramas y ADR versionados, motor de datos oficial acordado. **H3 Desarrollo y contratos:** build reproducible de tres clientes, OpenAPI validado, migraciones aprobadas. **H4 Seguridad/calidad:** pruebas de autorización, Wompi, respaldo y carga ejecutadas con evidencia. **H5 Entrenamiento/piloto:** personal realiza flujos en sandbox y reporta hallazgos. **H6 Entrega:** informe final, aceptación, inventario de versiones y transferencia operativa.

Gobierno del proyecto: solicitante, responsable funcional, líder técnico, desarrolladores, QA, operación y protección de datos; personas y fechas por asignar. Actas de decisión y cambios se

almacenan en documentación. Un hito se considera cerrado solo con evidencia y aceptación formal.

10. Criterios de éxito y límites

- Integridad de pedidos y de pagos respaldada por pruebas.
- Segregación por rol, cliente y sede probada.
- Manuales de instalación/operación replicables en equipo limpio.
- Respaldo y restauración ejecutados.
- Riesgos críticos controlados y firmados.
- Métricas de rendimiento y usabilidad definidas antes de medir.

Los anteriores son criterios propuestos, no resultados. Presupuesto total, duración, roles nominativos, establecimiento piloto y propiedad intelectual requieren información aportada por el equipo.

10. Gestión de interesados y comunicación

La gobernanza propuesta requiere un patrocinador funcional para validar objetivos, un representante de operación gastronómica que confirme estados y reglas de negocio, un responsable de backend para contratos y datos, responsables de interfaz web y móvil, un equipo de calidad para evidencias y un propietario documental para vigencia de los entregables. No se dispone de designaciones nominales ni firmas; los cargos constituyen roles de proyecto sugeridos.

El equipo celebrará revisión de avance por incremento o entrega funcional, registrará decisiones en acta con ID, contexto, alternativas, decisión, impacto, responsable y fecha, y conservará las aprobaciones dentro de un sistema de control de versiones. Las decisiones con consecuencia financiera, de seguridad o privacidad requieren la revisión simultánea de operaciones, backend y pruebas, incluso si una implementación concreta solo toca una capa.

10.1. Matriz de responsabilidades de referencia

Actividad	Responsable de ejecución	Revisión / aprobación	Evidencia mínima
Alcance de pedido	Analista funcional	Representante operativo	SRS y acta
Cambios API	Backend	Líder técnico y clientes	OpenAPI y casos de prueba
Validación de caja/pagos	Integraciones	QA y operaciones	Pruebas sandbox y conciliación
Entregas y tracking	Móvil / backend	Operaciones y QA	Caso de entrega sintético
Documentación	Responsable documental	Líder técnico/instructor	Commit, versión y aprobaciones
Seguridad	Responsable designado	Líder técnico	Matriz de riesgos y remediación

11. Criterios de transición de etapas

Salida de análisis: requisitos con identificadores, actor, disparador, pre/postcondiciones y criterios de aceptación revisados. **Salida de diseño:** arquitectura actual, contratos, modelo de datos conceptual, amenazas e impactos de cambio aceptados. **Salida de construcción:** builds reproducibles e integraciones registradas. **Salida de validación:** actas con procedimiento, ambiente, resultado observado, evidencia y defectos abiertos. **Salida a producción:** backup y restauración probados, secretos externalizados, TLS y dominios correctos, monitoreo y procedimiento de reversión aprobados.

No se considera cumplido un hito por disponer únicamente del archivo que lo nombra. Una matriz con evidencia, fecha y firma debe acompañarlo. El cierre académico es distinto del despliegue comercial.

12. Supuestos, restricciones y condiciones de éxito

Se asume que el equipo podrá ejecutar los tres proyectos con configuraciones compatibles, que la pasarela de pago ofrece sandbox y que la base de datos de prueba podrá reconstruirse sin usar información de clientes. Las restricciones son el acceso a infraestructura operativa, licencias y secretos, la necesidad de coordinación entre tres repositorios y los límites de verificación estática. La adopción real y la rentabilidad no son indicadores que puedan concluirse mediante revisión de código.

Se considerará éxito documental cuando: todos los documentos de la matriz tengan contenido y control de versión; los hallazgos apunten a archivos verificables; las referencias científicas

puedan localizarse; la SRS se relacione con escenarios de prueba; los manuales permitan un arranque en entorno nuevo; y las pruebas no realizadas se mantengan señaladas hasta producir evidencia auténtica.

Fuentes primarias de implementación

- API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main
- Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main
- Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main
- Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.

12. Identificación del proyecto y patrocinio académico

Responsable del documento y participante reportado: Yerson Stiven Cuellar Rubiano, ficha 3145555. La denominación de programa, instructor, centro de formación, patrocinador, fecha de aprobación y firmas no fueron suministradas y no se sustituyen por datos imaginados. Se requieren registros auténticos para declarar el acta aprobada.

Necesidad de negocio identificada: coordinación de la operación gastronómica en múltiples sedes y canales, evitando duplicidad en pedidos y falta de continuidad informativa entre caja, cocina, repartidores y administración. La investigación documental permite formular hipótesis sobre mejora operativa, pero no demostrar beneficios cuantificados sin una línea base de tiempos, fallas y satisfacción.

Resultados de proyecto: especificación formal RF/RNF, diseño validable, API documentada, clientes web/móvil trazables, persistencia con migraciones, manuales de operación y calidad, casos de prueba y artículo de estudio de caso. Se define como cierre documental la entrega de evidencias verificables y la validación del instructor, no solamente el número de páginas.

13. Restricciones, supuestos y criterios de decisión

El trabajo toma como fuente tres repositorios: backend SaborExpressBack, frontend SaborExpressWeb y móvil SaborExpressMovil. Ningún repositorio demuestra por sí mismo pagos de producción, respaldos realizados, aceptación del usuario o un servidor desplegado. Se presupone acceso autorizado a un entorno de desarrollo para ejecutar QA en el futuro; la ejecución queda condicionada a credenciales y datos sintéticos.

Reglas de decisión: aprobar un hito únicamente cuando existan artefactos versionados; evitar deuda de seguridad crítica abierta al publicar; no pasar de Wompi sandbox a productivo sin consentimiento y revisión; registrar riesgos por responsable y fecha; mantener trazabilidad desde requisitos hasta ejecución.

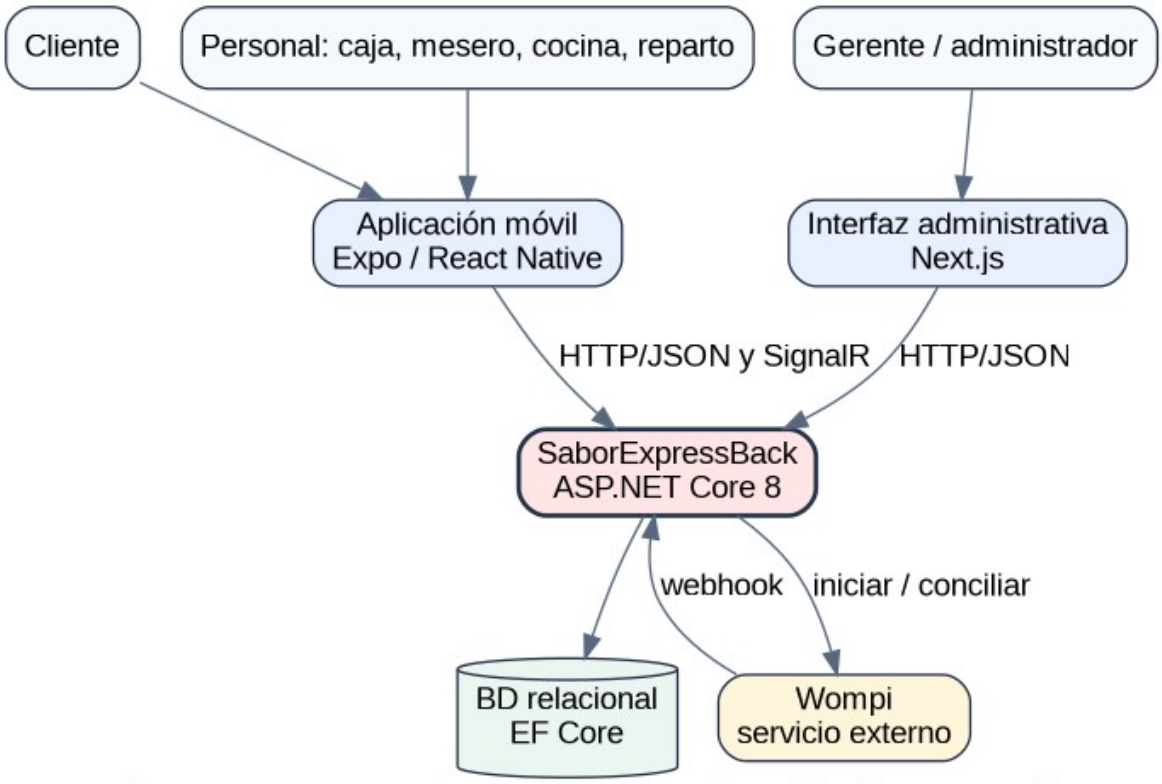


Figura 1. Contexto de SaborExpress (modelo documental)

01_CONTEXT0

Nota. Elaboración para el estudio de caso SaborExpress; las figuras no certifican operaciones desplegadas.
